

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について


令和3年4月

◆4月末現在の進捗状況【工事進捗率：2.0%】

【土木建築工事】

4月は建物をしっかりと支える地盤を作るための柱状地盤改良工事を引き続き行いました。また、工場棟の地中基礎用の掘削、ごみピットの掘削に伴う土工事を順次進めています。引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】

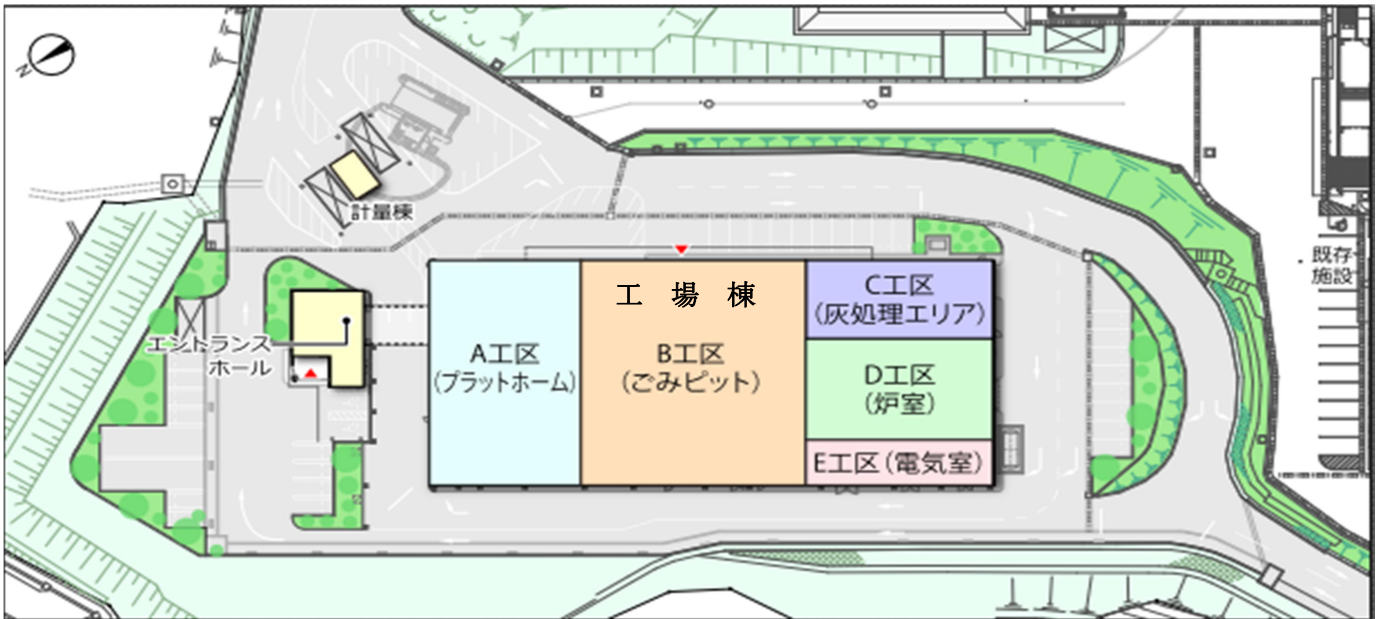

【ドローン撮影：令和3年4月15日】



◆全景写真：令和3年4月26日



◆柱状地盤改良工事

規定の深さまで土と固化材を混ぜ合わせ、地中に柱状の補強体（建物を支えるもの）を築造しています。

【写真①】柱状地盤改良



【写真②】柱状地盤改良



◆土工事

建物の地中基礎及びごみピットの構造体を構築するため、重機で規定の深さまで土を掘り取っています。

【写真③】掘削作業



【写真④】掘削作業



◆今後の予定【5月】

- ・建築工事：引き続き、工場棟の地中基礎の掘削、ごみピットの掘削工事を行います。5月下旬からは外周部の仮設表層改良工事を予定しています。

以上
