

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年3月

◆ 3月末現在の進捗状況【工事進捗率：38.59%】

【土木建築工事】


3月はごみピット・灰処理エリア・電気室において、地上26mまで鉄骨の組立を行いました。また、ごみピットでは4階躯体の鉄筋及び型枠工事を進め、3月下旬に躯体コンクリートの打設を行いました。

【プラント工事】

3月は灰処理エリア・炉室で大型製缶機器、ダクトを取込み、製缶機器の組立・溶接、ダクトの仮組みを行いました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】

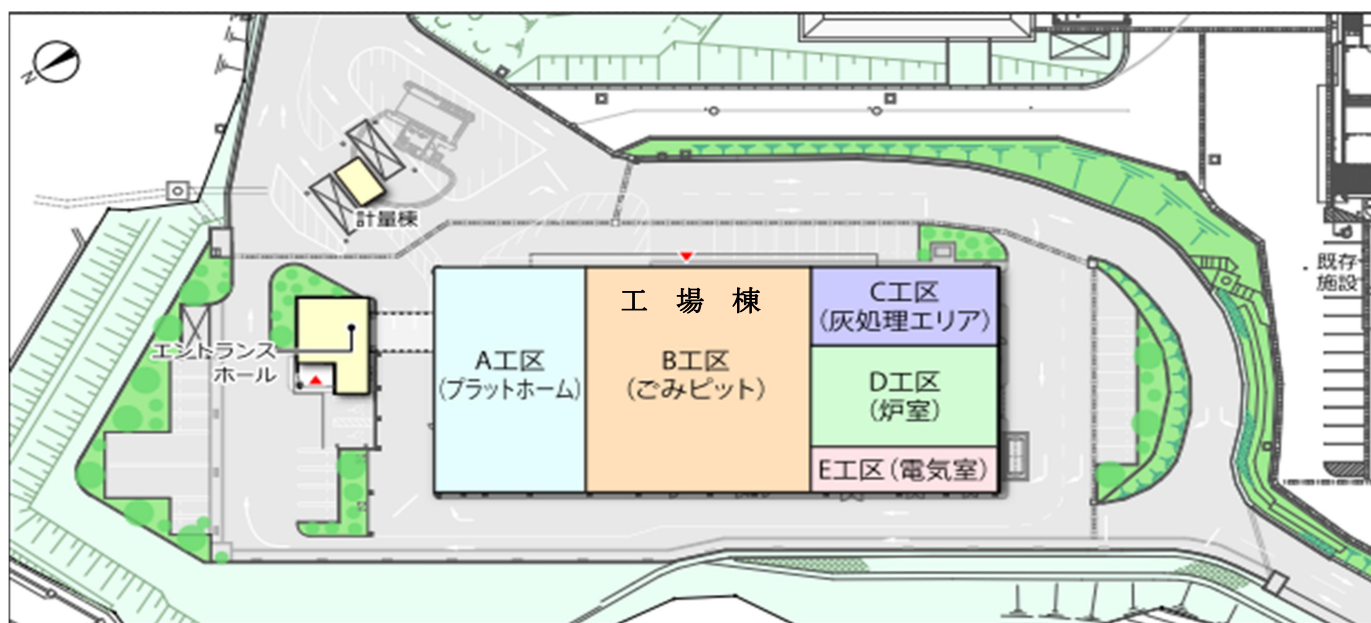

◆ 全景写真：令和4年3月25日



◆全景写真：令和4年3月25日



◆土木建築：コンクリート・鉄骨工事

ごみピットでは4階躯体コンクリートを打設し、灰処理エリアでは屋上デッキコンクリートを打設しました。また、ごみピット・灰処理エリア・電気室でクレーン車により地上26mまで鉄骨の組立を行っています。

【写真①】4階躯体コンクリート打設状況



【写真②】電気室 鉄骨組立状況



◆プラント：機器据付工事・ダクト据付工事

炉室にてガス冷却器、空気加熱器等、大型製缶機器の組立を行いました。灰処理エリアではダクトの取込み、仮組みを行いました。

【写真③】空気加熱器組立



【写真④】ダクト仮組み



◆今後の予定【4月】

- ・建築工事：引き続き、灰処理エリアで鉄骨の組立を行います。
また、中旬にはごみピット4階の躯体コンクリートを打設いたします。
- ・プラント工事：引き続き、機器の取込み、組立・溶接、ダクトの組立を行います。
また、4月中旬より焼却炉他の耐火工事を開始します。 以上
