

七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年5月

◆ 5月末現在の進捗状況【工事進捗率：52.84%】

【土木建築工事】

5月は電気室において、地上57mまで煙突部鉄骨の組立を行ない、ごみピットでは5階躯体の鉄筋及び型枠工事を進め、5月中旬に躯体コンクリートの打設を行いました。また、エントランス棟では建物の基礎工事を進めています。

【プラント工事】

5月は灰処理エリア、炉室、電気室での継続作業に加えて、ごみピットにおいて脱臭装置、ごみホoppa等の取込みを行いました。また、5月下旬より配管工事を開始しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

【工事現場：配置・工区図】



◆ 全景写真：令和4年5月27日



◆全景写真：令和4年5月27日




◆土木建築：鉄骨・コンクリート工事

ごみピットでは5階躯体コンクリートを打設し、電気室で地上57mの高さまで鉄骨の組立を行っています。また、エントランス棟では基礎工事を進めています。

【写真①】煙突部鉄骨組立状況

【写真②】エントランス棟施工状況

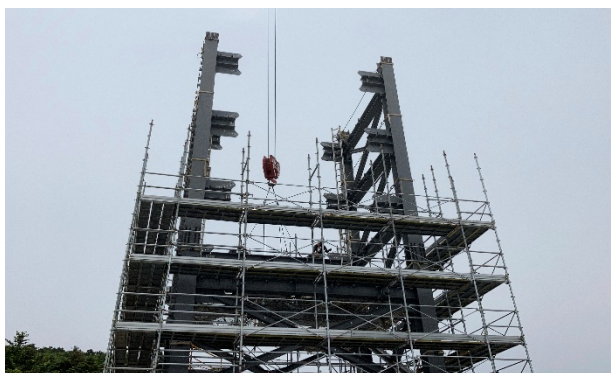


◆プラント：機器据付工事・耐火工事

ごみピットにごみホップの取込みを行いました。焼却炉内では耐火煉瓦の施工を行っています。

【写真③】ごみホップ取込み

【写真④】耐火煉瓦施工（焼却炉）

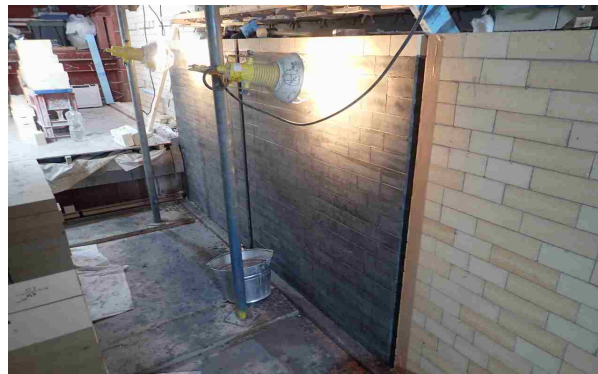

◆今後の予定【6月】

- ・ 建築工事 : 1～3階において内装工事、屋根鉄骨の塗装工事、また煙突部では外壁セメント板張りを行います。エントランス棟では中旬より鉄骨の組立を進めていきます。
- ・ プラント工事 : 引き続き、機器据付工事、ダクト工事、耐火工事、配管工事行なっていきます。また6月中旬より電気計装工事を開始します。
