

# 七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和4年11月

## ◆ 11月末現在の進捗状況【工事進捗率：94.80%】

### 【土木建築工事】

11月は工場棟及びエントランス棟において、内装・左官・塗装の仕上げ工事を行いました。  
また、外構部では排水路工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

### 【プラント工事】

11月も引き続き、各工区で配管工事、電気工事、保温工事を行いました。  
また、11月24日に火入式を執り行い、乾燥焚きを実施しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

### 【工事現場：配置・工区図】



## ◆ 全景写真：令和4年11月30日





◆全景写真：令和4年11月30日



◆土木建築：内装・塗装・左官・外構工事

外構工事では排水構造物を構築し、道路の融雪及び凍結防止のため路面の温度を上げるロードヒーティング配管、アスファルト舗装を進めています。

【写真①】ロードヒーティング配管状況



【写真②】アスファルト舗装状況




◆プラント：火入式・機器据付工事

11月24日に火入式を執り行いました。その後、乾燥焚きを行った後に、ろ過式集じん機にろ布、触媒分解塔に触媒の組込みを行いました。

【写真③】火入式



【写真④】ろ布組込み

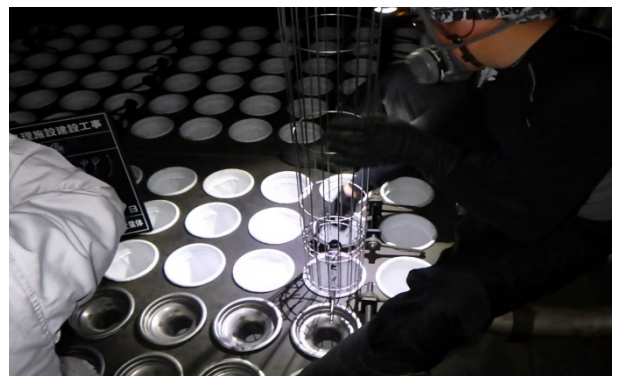

◆今後の予定【12月】

- ・建築工事：引き続き、外構部では雨水排水に伴う水路工事、ロードヒーティングによる融雪設備工事を進めていきます。
- ・プラント工事：12月1日よりごみの全量受入を開始し、第1期焼却運転を開始します。
