

# 七尾市ごみ処理施設建設工事 建設状況について

令和5年1月

## ◆ 1月末現在の進捗状況【工事進捗率：99.38%】

### 【土木建築工事】

1月は旧計量棟において内装解体工事を行いました。また、外構部では排水路工事、ロードヒーティング工事を随時進めています。

### 【プラント工事】

1月は試運転及び塗装工事（機器の名称）を行いました。試運転では焼却運転を継続して行い、1月11日から13日で予備性能試験を行い、問題なく運転していることを確認しました。

引き続き、環境に配慮した安全、安心な工事の進捗に努めていきます。

### 【工事現場：配置・工区図】



## ◆ 全景写真：令和5年1月31日



◆全景写真：令和5年1月31日



◆土木建築：解体・外構工事

旧計量棟において解体工事、また、外構工事ではロードヒーティング等の融雪設備工事、アスファルト舗装を進めています。

【写真①】旧計量棟 内装解体状況



【写真②】ロードヒーティング配管状況




◆プラント：試運転（焼却運転）・予備性能試験

1号炉、2号炉とも焼却運転を継続し、予備性能試験を実施しました。

【写真③】2号炉焼却運転



【写真④】予備性能試験

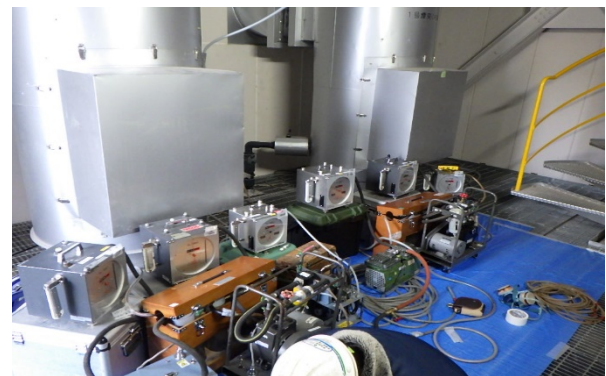

◆今後の予定【2月】

- ・ 建築工事：引き続き、旧計量棟の建屋解体工事及びロードヒーティング等の融雪設備工事を進めていきます。
- ・ プラント工事：試運転（焼却運転）を継続し、最終的な性能試験を実施します。
