

第19節 事業計画

第1項 段階的事業計画

令和3年度から着手する整備事業は、喫緊の課題である地形の保全や石垣や土塁等の地上遺構の保存、来訪者の利便性向上だけでも、多額の費用と時間と労力を必要とする。大手道の発掘調査や史跡の追加指定については不透明な部分が多い。また、雨水排水処理や防災対策については、活用整備事業の中で調査から計画、設計へと段階的に進めて行くこととなる。一度に多くの計画を手掛けることは費用面だけでなく、実施体制においても負担が大きい。そこで効率的かつ着実に整備を計画、実行していくため事業項目に優先順位を設ける。

短期事業計画として10年の事業期間を設け、当面優先すべき実施内容を盛り込む。発掘調査成果を受け、整備の方向性を検討する項目については、中長期事業計画での実施を目指す。短期事業計画は前期5年(令和3～7年度)と、後期5年(令和8～12年度)にわけ、5年目にそれまでの事業実績を評価するとともに、事業の評価や進捗状況に応じて後期の事業内容を見直す。本整備計画も実施期間を10か年としていることから、中長期事業計画を実施するにあたっては、事業の進捗や成果を基に次の整備計画を策定する。

短期事業計画は遺構の保存を大前提とするものの、保存と活用のバランスを考慮した計画とし、風水害や地震に対しては緊急的に対応していくものとする。事業期間中は定期的に整備検討委員会(仮)を開催し、実施内容の報告や指導・助言を受け、以後の調査や整備に反映させていく。

第2項 短期事業計画

令和3～12年度の短期事業計画で実施する主な調査・整備内容を以下に示す。

●虎口の発掘調査と復元検討(令和6～12年度)

本丸西側虎口(令和6～8年度)および桜馬場北側虎口(令和9年度以降)の発掘調査を行い、遺構の性格と遺存状況を解明する。発掘調査成果や史資料、他事例を基に虎口および櫓門の復元検討(令和10～12年度)を行う。

●大手道の発掘調査(令和3・4・8～12年度)

大手道(門の高～高屋敷)の追加指定にむけて、所在と構造を解明するため発掘調査および整理作業、報告書の刊行を行う(令和8～12年度)。発掘調査の実施時期については、実施体制の構築状況を勘案したものとする。令和元年度の発掘調査の整理作業と報告書の刊行を令和3～4年度に行なう。

●九尺石の発掘調査(令和4～7年度)

緩みが生じている九尺石の復旧に先行して発掘調査を行い、石垣の遺存状況および構造を解明する。調査成果を基に復旧に必要となる実施設計を行う。また、石垣解体時にも発掘調査を行い、構築年代や破損原因等を探る。

●石垣調査(令和3～5年度)

悉皆(破損)調査により石垣調査表の更新を行う。破損個所にはガラス棒を設置して、定期的に

動態調査を行う。調査結果を基に遺構の遺存状況と来訪者の安全確保を考慮した石垣保存整備計画を立てる。計画策定後は定期的に動態調査を実施していく。

●石垣の復旧と保存措置（令和4～7・9・10年度）

九尺石の復旧を優先的に行う。周辺地形の変化が石垣の破損と関係していることから、地形保全と一体的に石垣の復旧を行う。先行して九尺石（令和4～7年度）および本丸北側斜面石垣（令和4～5年度）について周辺の地盤調査や石垣測量等を行い、専門家の指導のもと整備内容を検討する。その他の復旧や保存措置が必要な石垣は、石垣保存整備計画に沿って整備していく。

●本丸西側虎口の表示等整備（令和11・12年度）

発掘調査成果を反映した表示等整備を行う。

●大手道の復元展示（令和5～7年度）

能越自動車道の高架下に遺存する大手道（路面と側溝）の復元展示を行う。遺構整備に合わせて、解説板の設置や動線整備を行う。

●七尾城登山口駐車場の便所建設（令和3年度）

令和3年4月の供用開始に向けて整備が進んでいる七尾城登山口駐車場内に便所の建設、バスの停留所と専用ルートの整備を行う。便所は休憩スペースや史跡七尾城跡に関する解説、周辺の関連遺跡や観光地等の情報案内板等を備えた建物内に組み込む。建設後の展示・解説施設整備が完了した段階で開放を予定する。

七尾城登山口駐車場を史跡七尾城跡の玄関口と位置づけ、総合案内板や誘導板を設置するとともに、城山交差点にある標識（石柱）の大手道の起点部分への移設を検討する。

●本丸駐車場の改修（令和5～7年度）

駐車台数を増やすため区画線の引き直しや車止めの設置等による改修を行う。市道南大呑1号線沿線での駐車場スペース確保を検討する。

●活用上必要な諸施設の更新・設置（令和3～10年度）

柵やベンチの更新や新設、園路整備等を地区もしくは曲輪ごとに行っていく。

●史跡の追加指定と土地の公有化（令和12年度以降）

周辺部も含めて条件が整った区間から順次申請する。

●植生管理（令和3～9年度）

遺構の保存や顕在化、見透しや眺望確保を目的とした樹木や草本類の伐採、剪定を地区もしくは曲輪ごとに行っていく。

表 5-11 短期事業計画表 - 1

			前 期					後 期				
			R 3	R 4	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
史跡指定地	A-1	本丸・二の丸	植生調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	2	三の丸	植生調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	3	寺屋敷	植生調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	4	長屋敷	植生調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	5	中心部縁辺の曲輪群	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	6	中心部縁辺の斜面	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	7	物見台	植生調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	8	曲輪外・斜面	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	9	大手道	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	10	大手道	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
史跡指定地外	B	大手道	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	C	大手道	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	D-1	大手道	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	2	七尾城登山口駐車場	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
	3	七尾城史資料館・懐古館	七尾城史資料館の取り扱い決定後に必要な施設整備を行う									
(仮)整備検討委員会			石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
史跡の追加指定・土地の公有化			石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
整備工事報告書			石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査
次期整備基本計画策定			石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査	石垣調査


植生調査 石垣調査

表 5-12 短期事業計画表-2

内 容		前 期					後 期				
		令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)	令和12年度 (2030)
史跡指定地	A-1 本丸・二の丸	発掘調査および復元検討 対象箇所 桜馬場北側虎口	発掘調査	整理作業	報告書				発掘調査	整理作業	報告書
			表示等整備 本丸西側虎口			発掘調査	整理作業	報告書	★ 実施設計	表示整備	
		石垣の復旧 九尺石	発掘調査	整理作業	報告書						
			地盤調査 石垣調査	★ 実施設計	石垣復旧						
		本丸北側斜面	地盤調査 石垣調査	★ 実施設計	石垣復旧						
		その他	石垣調査(調査表の更新)	石垣調査(保存整備計画策定)			★ 実施設計	石垣復旧	規模に応じて延長		
		植生管理	植生調査	実施設計 剪定・伐採	実施設計 剪定・伐採						
		活用上必要な施設整備		実施設計	更新・新設						
	本丸駐車場の改修		実施設計	改修							
	2 三の丸	植生管理	植生調査			実施設計 剪定・伐採					
活用上必要な施設整備				実施設計	更新・新設						
石垣の復旧		石垣調査(調査表の更新)	石垣調査(保存整備計画策定)				★ 実施設計	石垣復旧			
3 寺屋敷	植生管理	植生調査			実施設計 剪定・伐採						
	活用上必要な施設整備			実施設計	更新・新設						
	石垣の復旧	石垣調査(調査表の更新)	石垣調査(保存整備計画策定)				★ 実施設計	石垣復旧			
4 長屋敷	植生管理	植生調査			実施設計 剪定・伐採						
	活用上必要な施設整備			実施設計	更新・新設						
	石垣の復旧	石垣調査(調査表の更新)	石垣調査(保存整備計画策定)				★ 実施設計	石垣復旧			
5 中心部縁辺の曲輪群	活用上必要な施設整備	必要に応じて実施									
6 中心部縁辺の斜面	大手道の保存整備			実施設計	整備						
7 物見台	植生管理	植生調査				実施設計 剪定・伐採					
	活用上必要な施設整備				実施設計	更新・新設					
8 曲輪外・斜面	活用上必要な施設整備				実施設計	整備					
	植生管理・防災対策	必要に応じて実施									
9 大手道	大手道の復元展示	★ 実施設計	整備								
10 大手道	★ 大手道の保存整備	実施設計	整備								
史跡指定地外	B 大手道	活用上必要な施設整備	実施設計	整備							
	C 大手道	発掘調査	整理作業	報告書			発掘調査	整理作業	報告書		
	D-1 大手道	活用上必要な施設整備	実施設計	整備							
		2 七尾城登山口駐車場	便所建設	実施設計	整備						
	3 七尾城史資料館・懐古館	活用上必要な施設整備	実施設計	整備			七尾城史資料館の取り扱い決定後に必要な施設整備を行う				


重点事業項目：短期事業計画の中でも優先的に実施していく項目と位置付ける。

★の実施設計および施工監理は専門業者に外部委託する。
本丸駐車場の改修・便所建設・諸施設の更新および新設・植生管理は七尾市が直営で設計・監理を行う。

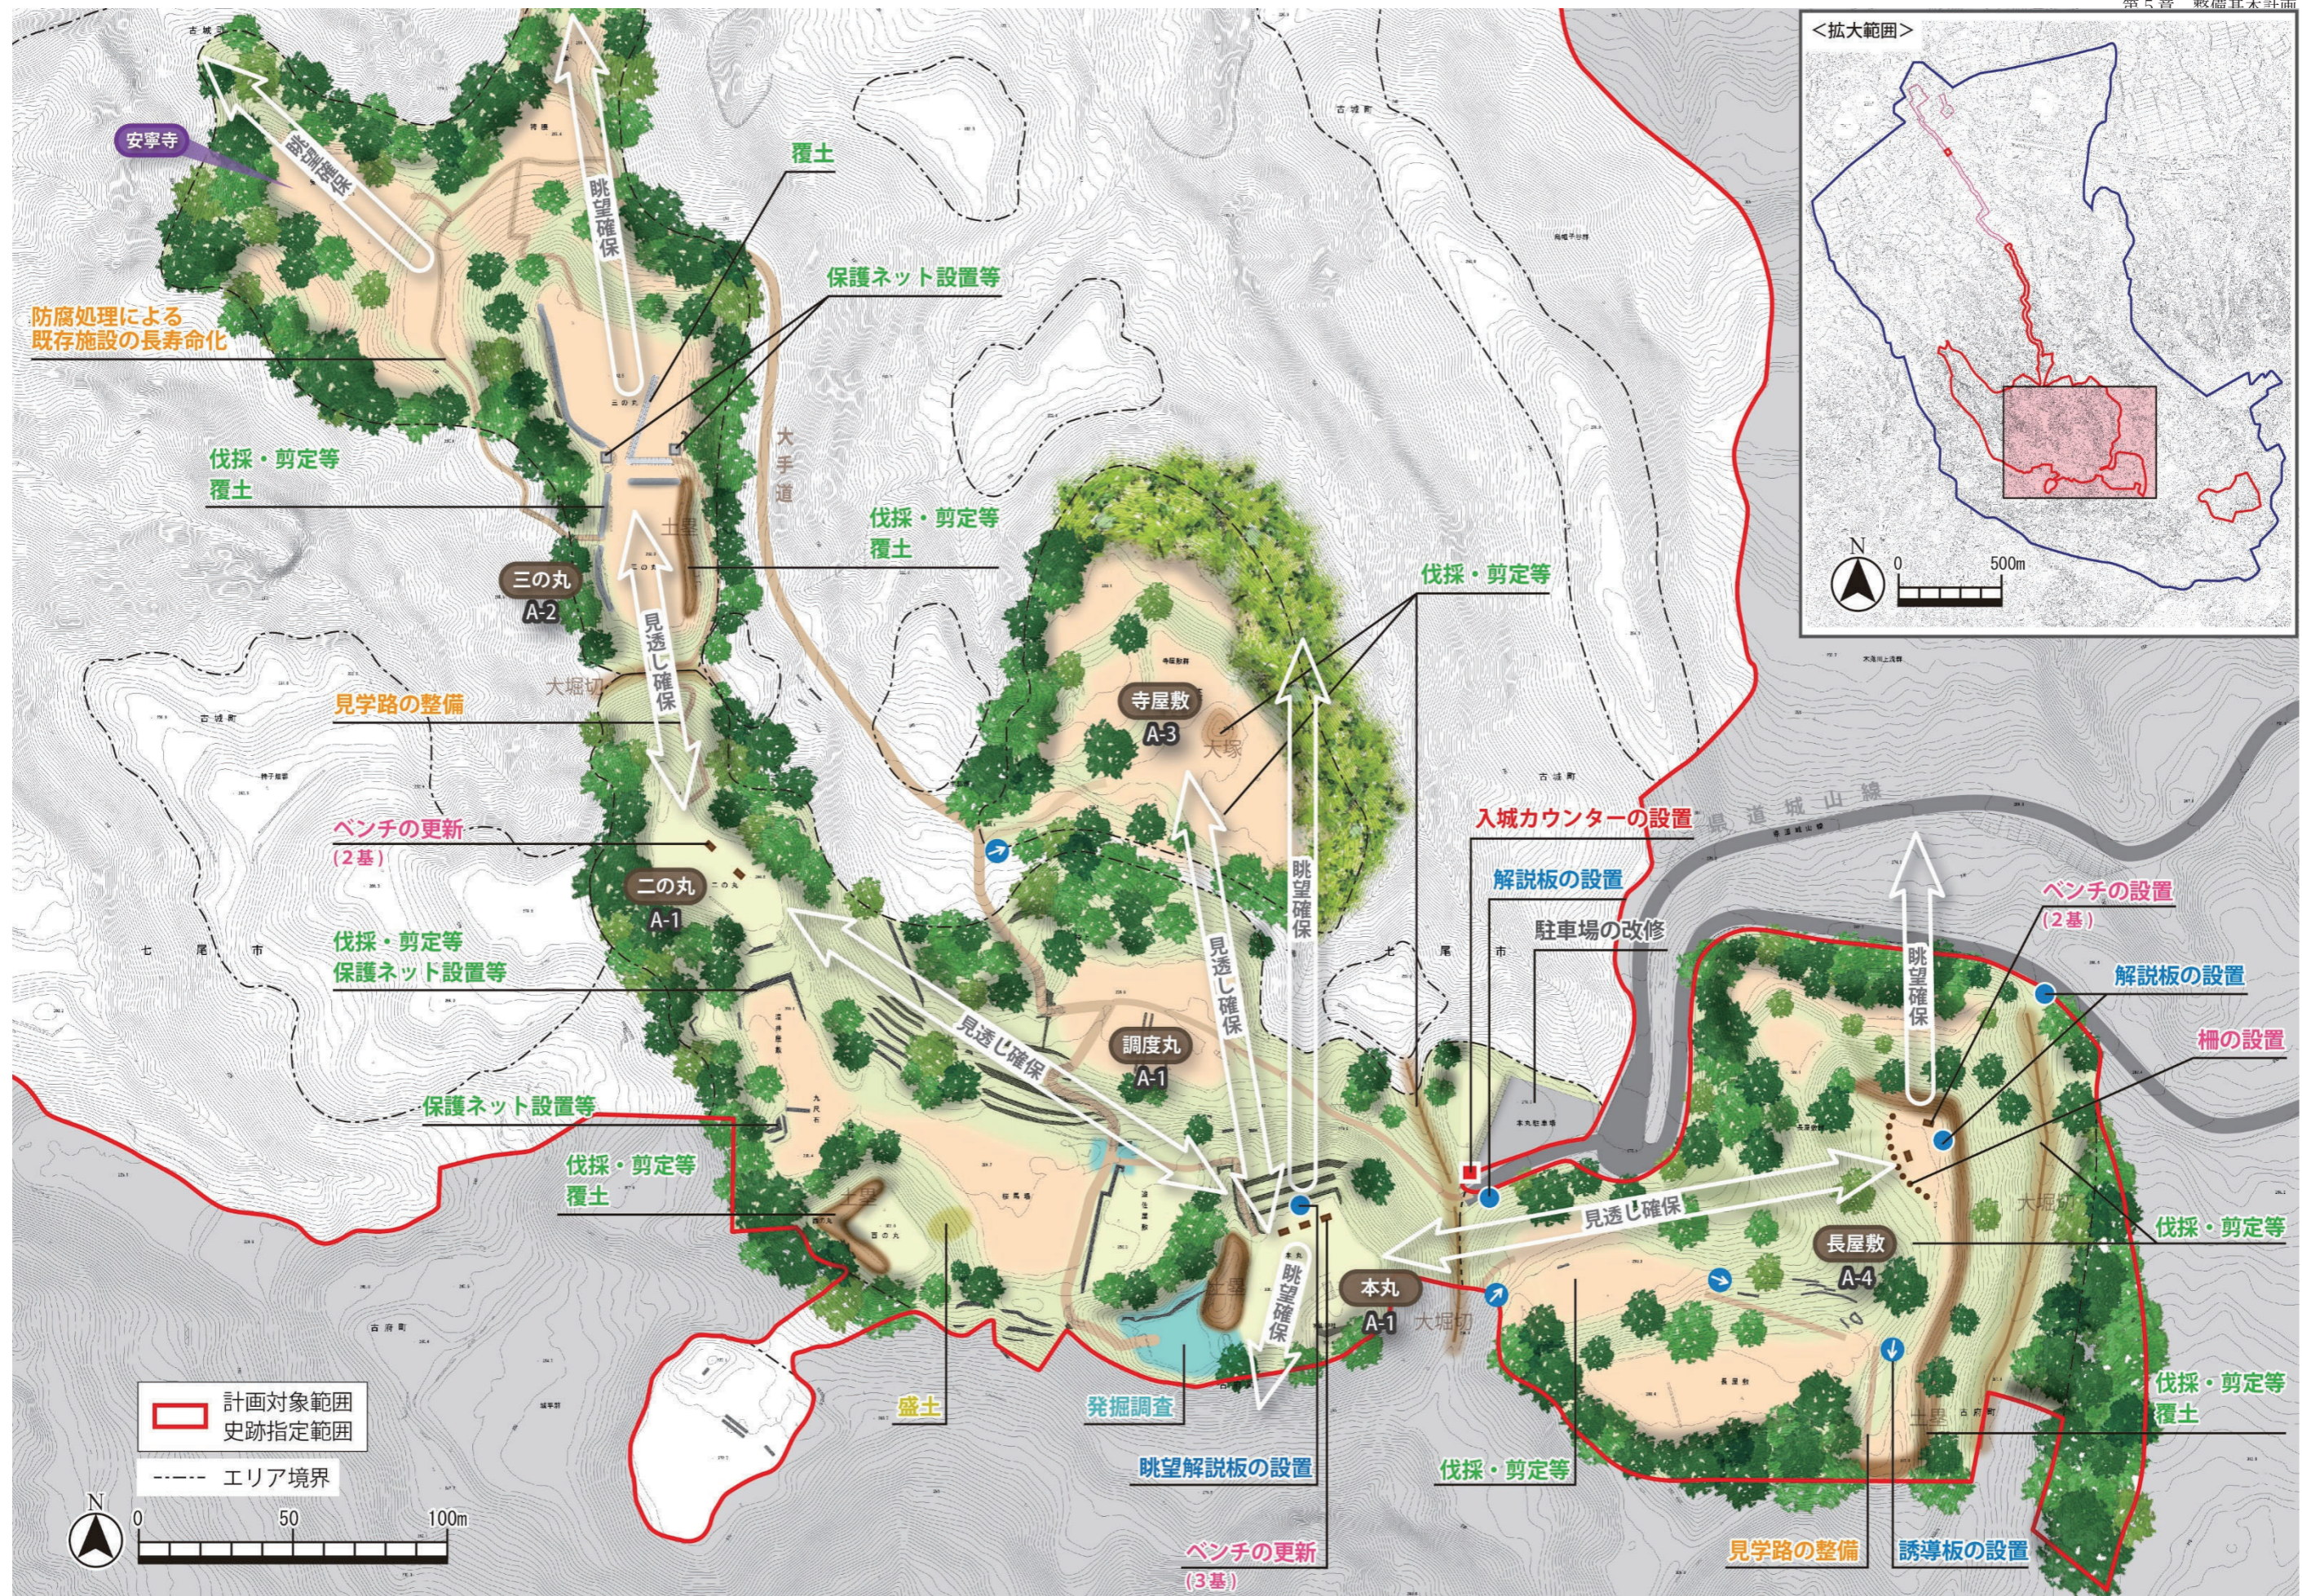


(ベース：測量図※数値地形図)

図 5-39 整備計画図(A-1～4地区)

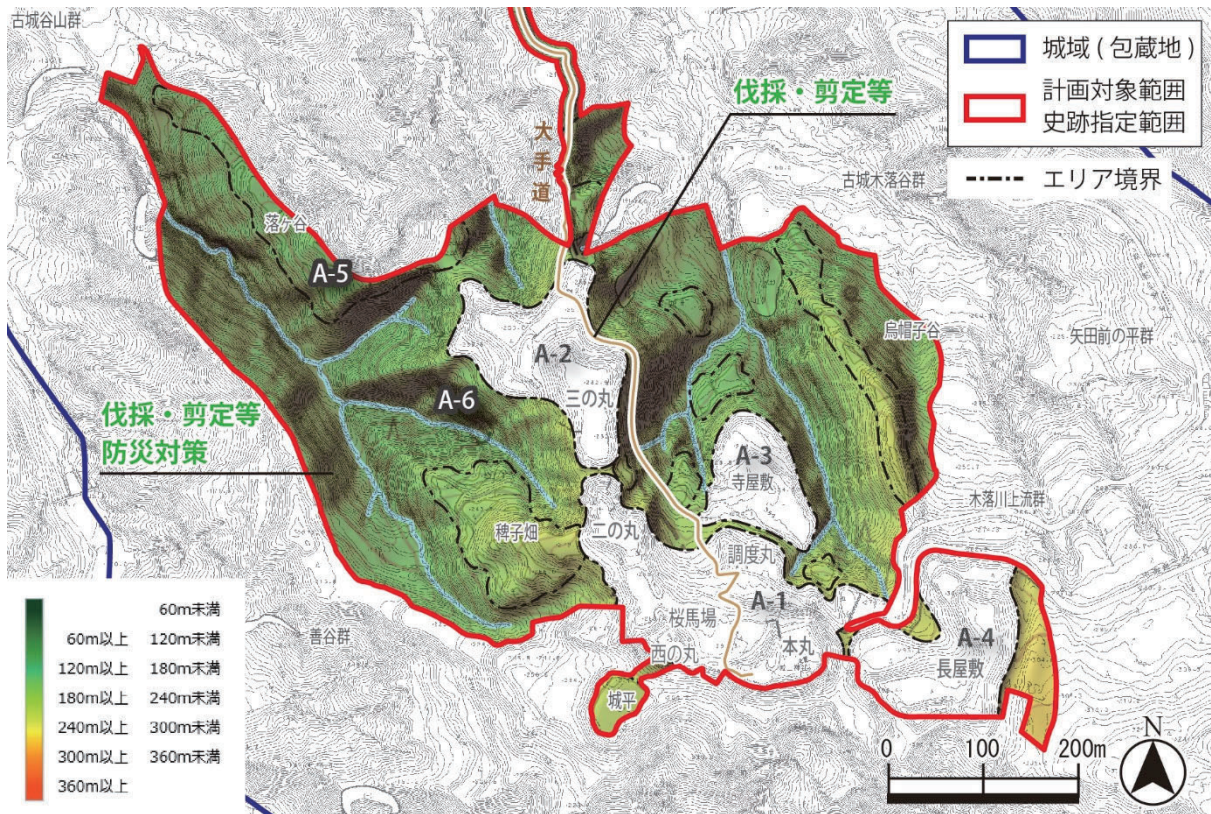

(ベース：史跡七尾城跡平面図 S=1/3,500 ※標高図：国土地理院)

図 5-40 整備計画図(A-5・6地区)

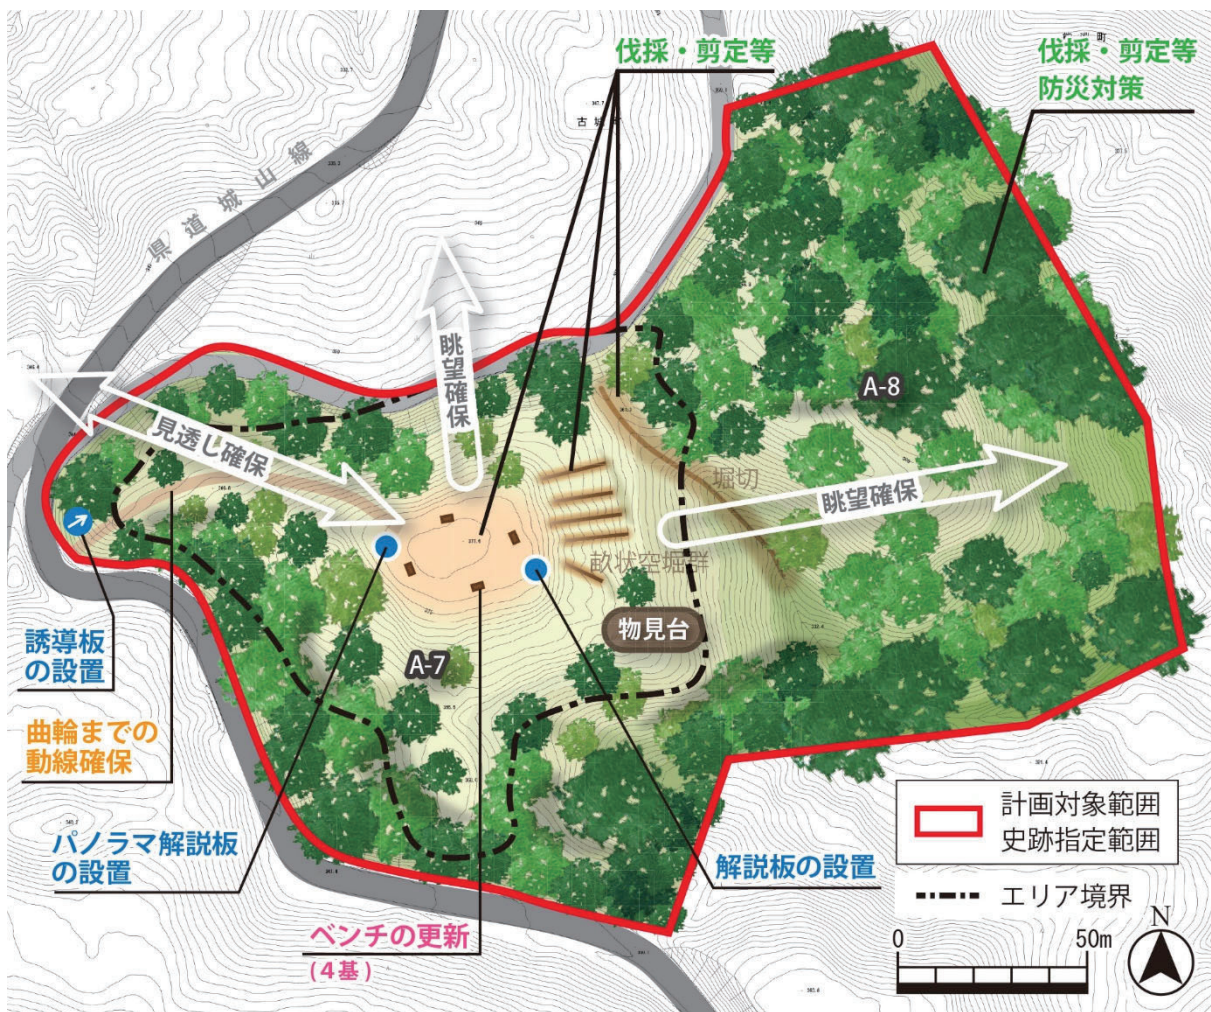

(ベース：測量図※数値地形図)

図 5-41 整備計画図(A-7・8地区)
